

IE9 UDFASNING

ET LILLE SUCCES PROJEKT

ITS TEMAMØDE – 2016-05-11
FIB@ITS.AAU.DK



AALBORG UNIVERSITET

IT SERVICES
AALBORG UNIVERSITET

INDHOLD

- Projektets oprindelse
- Projektorganisation
- Problemet/løsningen
- Planen
- Samarbejdsformen
- Udfordringerne
- Status
- Hvad lærte projektlederen?


**Ca. 10
minutter**



PROJEKTETS OPRINDELSE

- ISU påpeger at Internet Explorer 9 (IE9) udløber for support pr januar 2016, allerede tilbage i efteråret 2014
- ITS indhenter overslagspris fra konsulenthus på analyse og løsningsforslag, forår 2015
- Erfaringer om erstatning af IE9 indsamles sommer 2015
- IE9 udfasning, første styregruppemøde november 2015

Lidt
langsomt



PROJEKTORGANISATION (OG ROLLER)




Styregruppeformand
Michael Collin
ITS/SUP




Projektleder
Finn Büttner



Seniorleverandør
Per Bach Sørensen
ITS/IFS



Seniorbruger
Lisa Thordal Lavrsen
ØA-IT



Seniorbruger
Jørgen Erik Lund
Studie Service

PROBLEMET/LØSNINGEN

- Fokus: den administrative PC og en hel del administrative systemer
- IE9 -> IE11 og evt. anvendelse af Enterprise mode
- Felttest skal verificere og give tillid
- Udrulning i bølger

**Kun IE9 til
ØSS!**



PLANEN

Vandfalds- projekt

Dato/uge	07-12-2015	14-12-2015	21-12-2015	28-12-2015	04-01-2016	11-01-2016	18-01-2016	25-01-2016	01-02-2016	08-02-2016	15-02-2016	22-02-2016	29-02-2016	07-03-2016	14-03-2016	21-03-2016	28-03-2016	04-04-2016
Aktivitet	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Juleferie																		
Vinterferie																		
Påske																		
IE11 Enterprisemode sites																		
IE11 trusted sites																		
IE11 pakke impl.																		
ITS IE11 udrulning/verifikation																		
IE11 selektiv udrulning (person niveau)																		
Gruppe 1																		
Gruppe 2																		
Gruppe 3																		
ITS IE11 support fokus /m reserve PC'er																		
IE11 udrulning, afdelingsvis																		
Rul 1, afdeling X-Y-X																		
Rul 2, afdeling X-Y-X																		
Rul 3, afdeling X-Y-X																		
Rul X, afdeling X-Y-X																		
IE11 tests																		
ITS Pretest: ØSS, STADS, ScanPas mm																		
ØA-IT, Qlikview																		
Studie Service, iStads, eStads uni-start, SU2000, Dig.eksamen, AAUcard																		
ØA, alle arbejdsprocesser/systemer																		
HR, Scanpas (mm)																		
Styregruppemøde							X		X		X							
CISD opdatering, progres og IE9								X		X		X		X		X		X

SAMARBEJDSFORMEN

- Projektlederen den mest formelle på styregruppemøderne
- Referat fra styregruppemøder per email
- Arkitekt og projektleder afholder møde med ØA-IT, og åbner for direkte ”support”
- Projektleder arbejder også som seniorbruger, fx link til HR
- Uformelt projektsamarbejde

Gå efter
bolden



UDFORDRINGERNE


- ISU/CISO kræver løbende opdateringer
- ISU tror ikke på løsningen, eller?
- Ingen eksisterende link fra afdeling->bruger->PC
- Vil ikke opgraderer til IE11 pga. ØSS
- Zoner og forskellige sub-domæner
- Andre PC'er med IE9 ("imported") !!
- Mange PC reinstallationer hos onsite-city
- People XS, fulluserne har udfordringer
- IE11 har en fejl, og dur' ikke til iSTADS

Ingen vej
uden
bump



STATUS, IE11

Computere

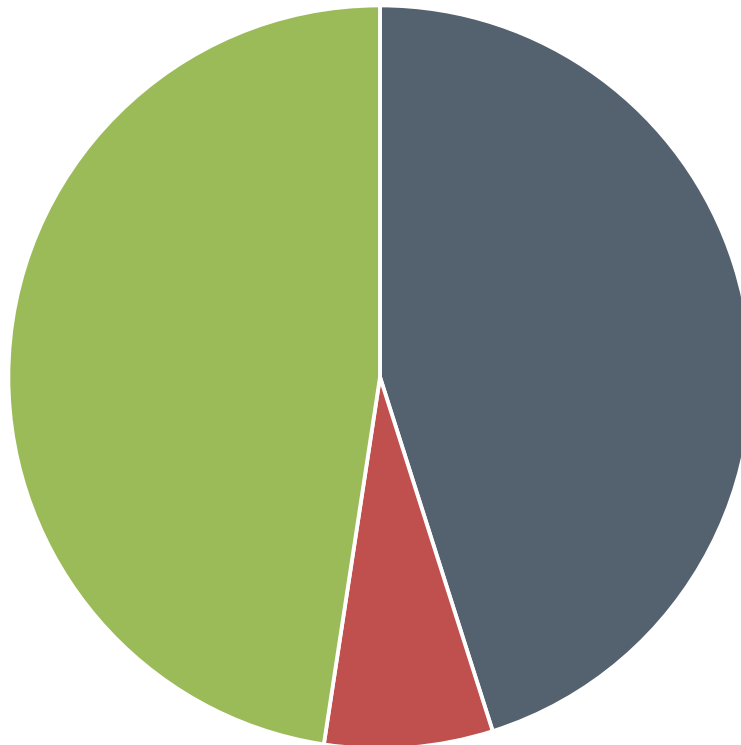

■ AAU-PC ■ Non Compliance ■ IE11 Upgrade

Vi er i mål



HVAD LÆRTE PROJEKTLEDEREN?

- Få nu lavet den projektplan!
- Personlig dialog er guld
- Sikre at medarbejder laver det de er bedst til
- Projektlederen er også en ressource i projektet, der kan udfylde "huller"
- Projektleder ikke "bare" en dirigent

**ToDo:
Projekt-
evaluering**

